



Ministère de l'Intérieur de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local

Programme National de Déminage Humanitaire
pour le Développement
(PNDHD)



Introduction

La contamination par armes à sous-munitions reste actuelle, continue de causer des victimes parmi les populations et empêche l'exploitation de certaines terres. Malgré les efforts considérables du PNDHD, le manque de financement retarde les opérations de dépollution et contraint la Mauritanie à rallonger les délais nécessaires pour remplir ses obligations.



PNDHD

PLAN

1. Étendue de la contamination
2. Zones dépolluées par le PNDHD
3. Zones restantes à dépolluer
4. Défis



PNDHD

Mauritania

Algeria

Atlantic Ocean

Western Sahara

Mali

Mauritania

TIRIS-ZEMMOUR

Nouakchott

TRARZA

BRAKNA

Tidjikdja


TAGANT

HODH ORIENTAL

Dakar

Senegal

Mali

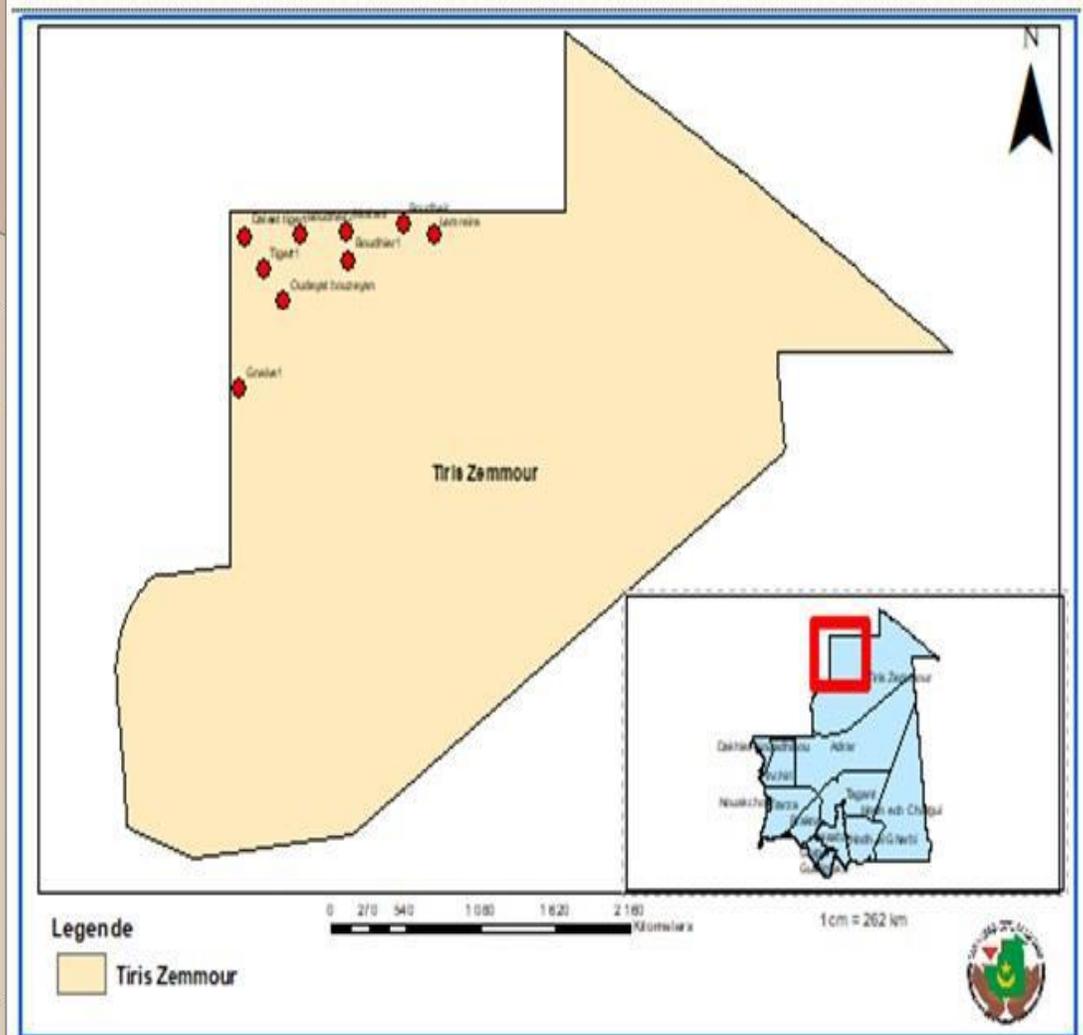

PNDHD

Demande d'Extension

La Mauritanie demande une extension de deux
ans



PNDHD

Contamination au moment de l'entrée en vigueur de la convention

#	Désignation	Superficie en m ²
1.	AYDIYATT	180,108
2.	AGHWACHIN	1,000,000
3.	BIR MARIAM	1,250,000
4.	DOUEIK	1,200,000
5.	GHARET EL HEMAID	1,850,000
6.	OUDEYATT BOUZEYAN	1,200,000
7.	OUM DBEIATT	1,000,000
8.	TIGHERT	1,500,000
9.	WINIGHET	1,000,000
	TOTAL AREA	10,180,108m²



PNDHD



PNDHD

Zones découvertes après la rentrée en vigueur de la convention

N°	Name of Area	Size (m ²)
1.	Tighert1	651830
2.	Guneivé	4683196
3.	Guneivé1	392998
4.	Guneivé2	177574
5.	Daalet Tighert	345703
6.	Oudeyatt Lekhyame	5326856
7.	El Motlani	120365
8.	Lemreire	2587276
9.	Boudheir	20556
10.	Boudheir1	38667
11.	Boudheir2	243147
12.	Dhbeiyatt	1587276
13.	Dhbeiyatt 1	693670
Total		16.869.114



PNDHD



PNDHD

Total des Zones polluées

N°	Name of Area	Size (m ²)
1.	Aghwachin	1000000
2.	Aydiyatt	180108
3.	Bir Mariam	1250000
4.	Doueik	1200000
5.	Gharet el hemaïd	1850000
6.	Oudeyatt bouzeyan	1200000
7.	Oum dbeiatt	1000000
8.	Tigert	1500000
9.	Winighet	1000000
10.	Guneivé	4683196
11.	Guneivé1	392998
12.	Guneivé2	177574
13.	Daalet Tighert	345703

N°	Name of Area	Size (m ²)
14.	Tighert1	651830
15.	Oudeyatt Lekhyame	5326856
16.	El Motlani	120365
17.	Lemreire	2587276
18.	Boudheir	20556
19.	Boudheir1	38667
20.	Boudheir2	243147
21.	Dhbeiyatt	1587276
22.	Dhbeiyatt 1	693670
Total		27.049.222



PNDHD



PNDHD

Zones dépolluées

N°	Name of Area	Size (m ²)	Réduit par ET (m ²)	Dépolluée (m ²)	Année
1.	Aghwachin	1,000,000	648,707	351,293	2012-2013
2.	Aydiyatt	180,108	30,000	150,108	2012-2013
3.	Bir Mariam	1,250,000	1,080,600	169,400	2012-2013
4.	Doueik	1,200,000	941,018	258,982	2012-2013
5.	Gharet el hemaïd	1,850,000	1,573,046	276,954	2012-2013
6.	Oudeyatt bouzeyan	1,200,000	887,376	312,624	2012-2013
7.	Oum dbeiatt	1,000,000	966,428	33,572	2012-2013
8.	Tigert	1,500,000	1,194,788	305,212	2012-2013
9.	Winighet	1,000,000	893,405	106,595	2012-2013
10.	Guneivé2	177,574	96,300	81,274	2021
11.	Guneivé1	392,998	29,050	363,948	2022
12.	Daalet Teghert	345,703	243,000	102,703	2024
13.	Dhbeiyatt	1,587,276	779,774	807,502	2025
Total		12,683,659	9,363,492	3,320,167	



PNDHD

Zones restantes polluées

N	Location	Zones dangereuses confirmées m ²	Types
1.	Dhbeiyatt1	693670	Blu 63
2.	Boudheir	20556	Blu 63
3.	Boudheir 1	38667	Blu 63
4.	Boudheir2	243147	Blu 63
5.	Guneivé	4683196	Blu 63
6.	Lemreire	2587276	Blu 63
7.	El motlani	120365	Blu 63
8.	Oudeyat lekhyam	5326856	MK 118
9.	Tighert 1	651830	MK 118
	Total	14 365 563	



PNDHD

Plan de travail avec le soutien de la communauté internationale

Activity	2025										2026						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
Mobilisation des ressources, identification de partenaires, Plaidoyer																	
Renforcement des capacités du PNDHD remise à niveau des équipes techniques																	
Etude non techniques																	
Etude technique																	
Education au risque																	
Dépollution																	
Assurance qualité et controle qualité																	
Mise en place de capacité de gestion de risques résiduels																	
Finalisation donnée, rapports et documentation des résultats																	



PNDHD

Plan de travail avec le soutien de la communauté internationale (suite)

Activities	2026					2027												2028								
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
Mobilisation des ressources, identification de partenaires, Plaidoyer																										
Renforcement des capacités du PNDHD remise à niveau des équipes techniques																										
Etude non techniques																										
Etude technique																										
Education au risque																										
Dépollution																										
Assurance qualité et contrôle qualité																										
Mise en place de capacité de gestion de risques résiduels																										
Finalisation donnée, rapports et documentation des résultats																										



PNDHD



PNHD

Plan de travail avec les moyens nationaux

Activités	Responsables	2025-2027	2028-2030	2031-2032	2034-2035
Evaluation et cartographies des zones dangereuses	Gestion des données		Mise à jour	Mise à jour	Mise à jour
Renforcement des capacités	Division des opérations	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Education aux risques	Equipes techniques	✓	✓	✓	✓
Enquete techniques	Technical teams	✓	✓	✓	✓
Dépollution	Technical teams	✓	✓	✓	✓
Suivi et évaluation	Quality management	✓	Mise à jour	Mise à jour	Mise à jour
Remise à disposition des terres	Staff et Autorités locales	✓	✓	✓	✓



PNDHD

Défis

- Manque de financement
- Renforcement des capacités équipements et formation du personnel



PNDHD



**Merci
de Votre
Attention**



PNDHD
